



CITY of BOSTON

北华盛顿街大桥翻新项目 在线公众信息会议

2022年10月18日 | 下午6:30 – 晚8:00

2022年10月19日 | 下午6:30 – 晚8:00

项目文件编号 604173



用于 10/18 会议的 Zoom 网络研讨会控件

- 
 - 收听西班牙语和普通话
- 
 - 提问或发表意见
- 
 - 请下拉菜单检查麦克风和扬声器
- 
 - 举手——电话参会用户请按 *9，并使用Alt + Y 键举手
- 
 - 如果您无法访问互联网或遇到技术问题，请致电1-646-876-9923参会，
网络研讨会ID： 824-4426-5958
- 
 - Zoom 自动生成的隐藏式字幕

Live Transcript



如果您在演示期间遇到会议技术问题，请致电：

+1-888-799-9666



公众会议记录和程序

公共记录

- 本次在线公众会议将录制。麻州交通部可能会视需要保存或发布相应视频、截图、音频和/或聊天记录。
- 本次会议的所有内容均视为公共记录。
- 如果您不希望被录制，请不要使用问答功能，或者您可以选择退出会议。本次会议的信息将张贴于 Mass.gov 网站。

重要提示

- 您的麦克风和网络摄像头在进入会议时将自动禁用。
- 会议将在讲演结束时开放问答功能。
- 请在讲演结束时花点时间填写我们的调查。 **您的反馈很重要。**

麻州交通部多元化和公民权利政策公告：

- MassDOT的所有活动，包括公众会议，均实施无歧视政策。
- MassDOT遵守联邦和麻州的一切公民权利要求，禁止基于性别、种族、肤色、血统、国籍（英语水平）、宗教、信仰、性别、性取向、性别认同或表达或军役身份的歧视。
- 我们欢迎来自MBTA全系统服务领域的多元多样参与者。如果您有任何疑问或疑虑，请访问 <https://www.mass.gov/nondiscrimination-in-transportation-program> 联系多元化和公民权利办公室。

感谢您参加我们的会议。我们重视您的参与！

议程

- 01 欢迎辞&介绍
- 02 项目状态
- 03 时间表更新
- 04 交通管理
- 05 讨论



咨询小组

- 吉姆·奥利里 - 麻州6区办公室
- 埃德·鲍曼 - 阿尔弗雷德·贝内施公司
(桥梁设计师)
- 克里斯·巴里 - JF怀特承建商
- 杰弗里·保罗 - JRP咨询服务
- 本·孙 - 波士顿市 DPW
- 比尔·康罗伊 - BTB
- 保罗·切夫雷特中士 - 波士顿警察局

会议制作人


- 利亚·格罗德斯坦 - 麻州交通部
- 克里斯托弗·克莱姆 - 麻州交通部
- 罗伊·柯瓦 - 麻州交通部

口译员

- 苏珊娜·卡雷拉 - 西班牙语
- Yan Wu - 普通话
- Qinxue Jin - 普通话



项目状态

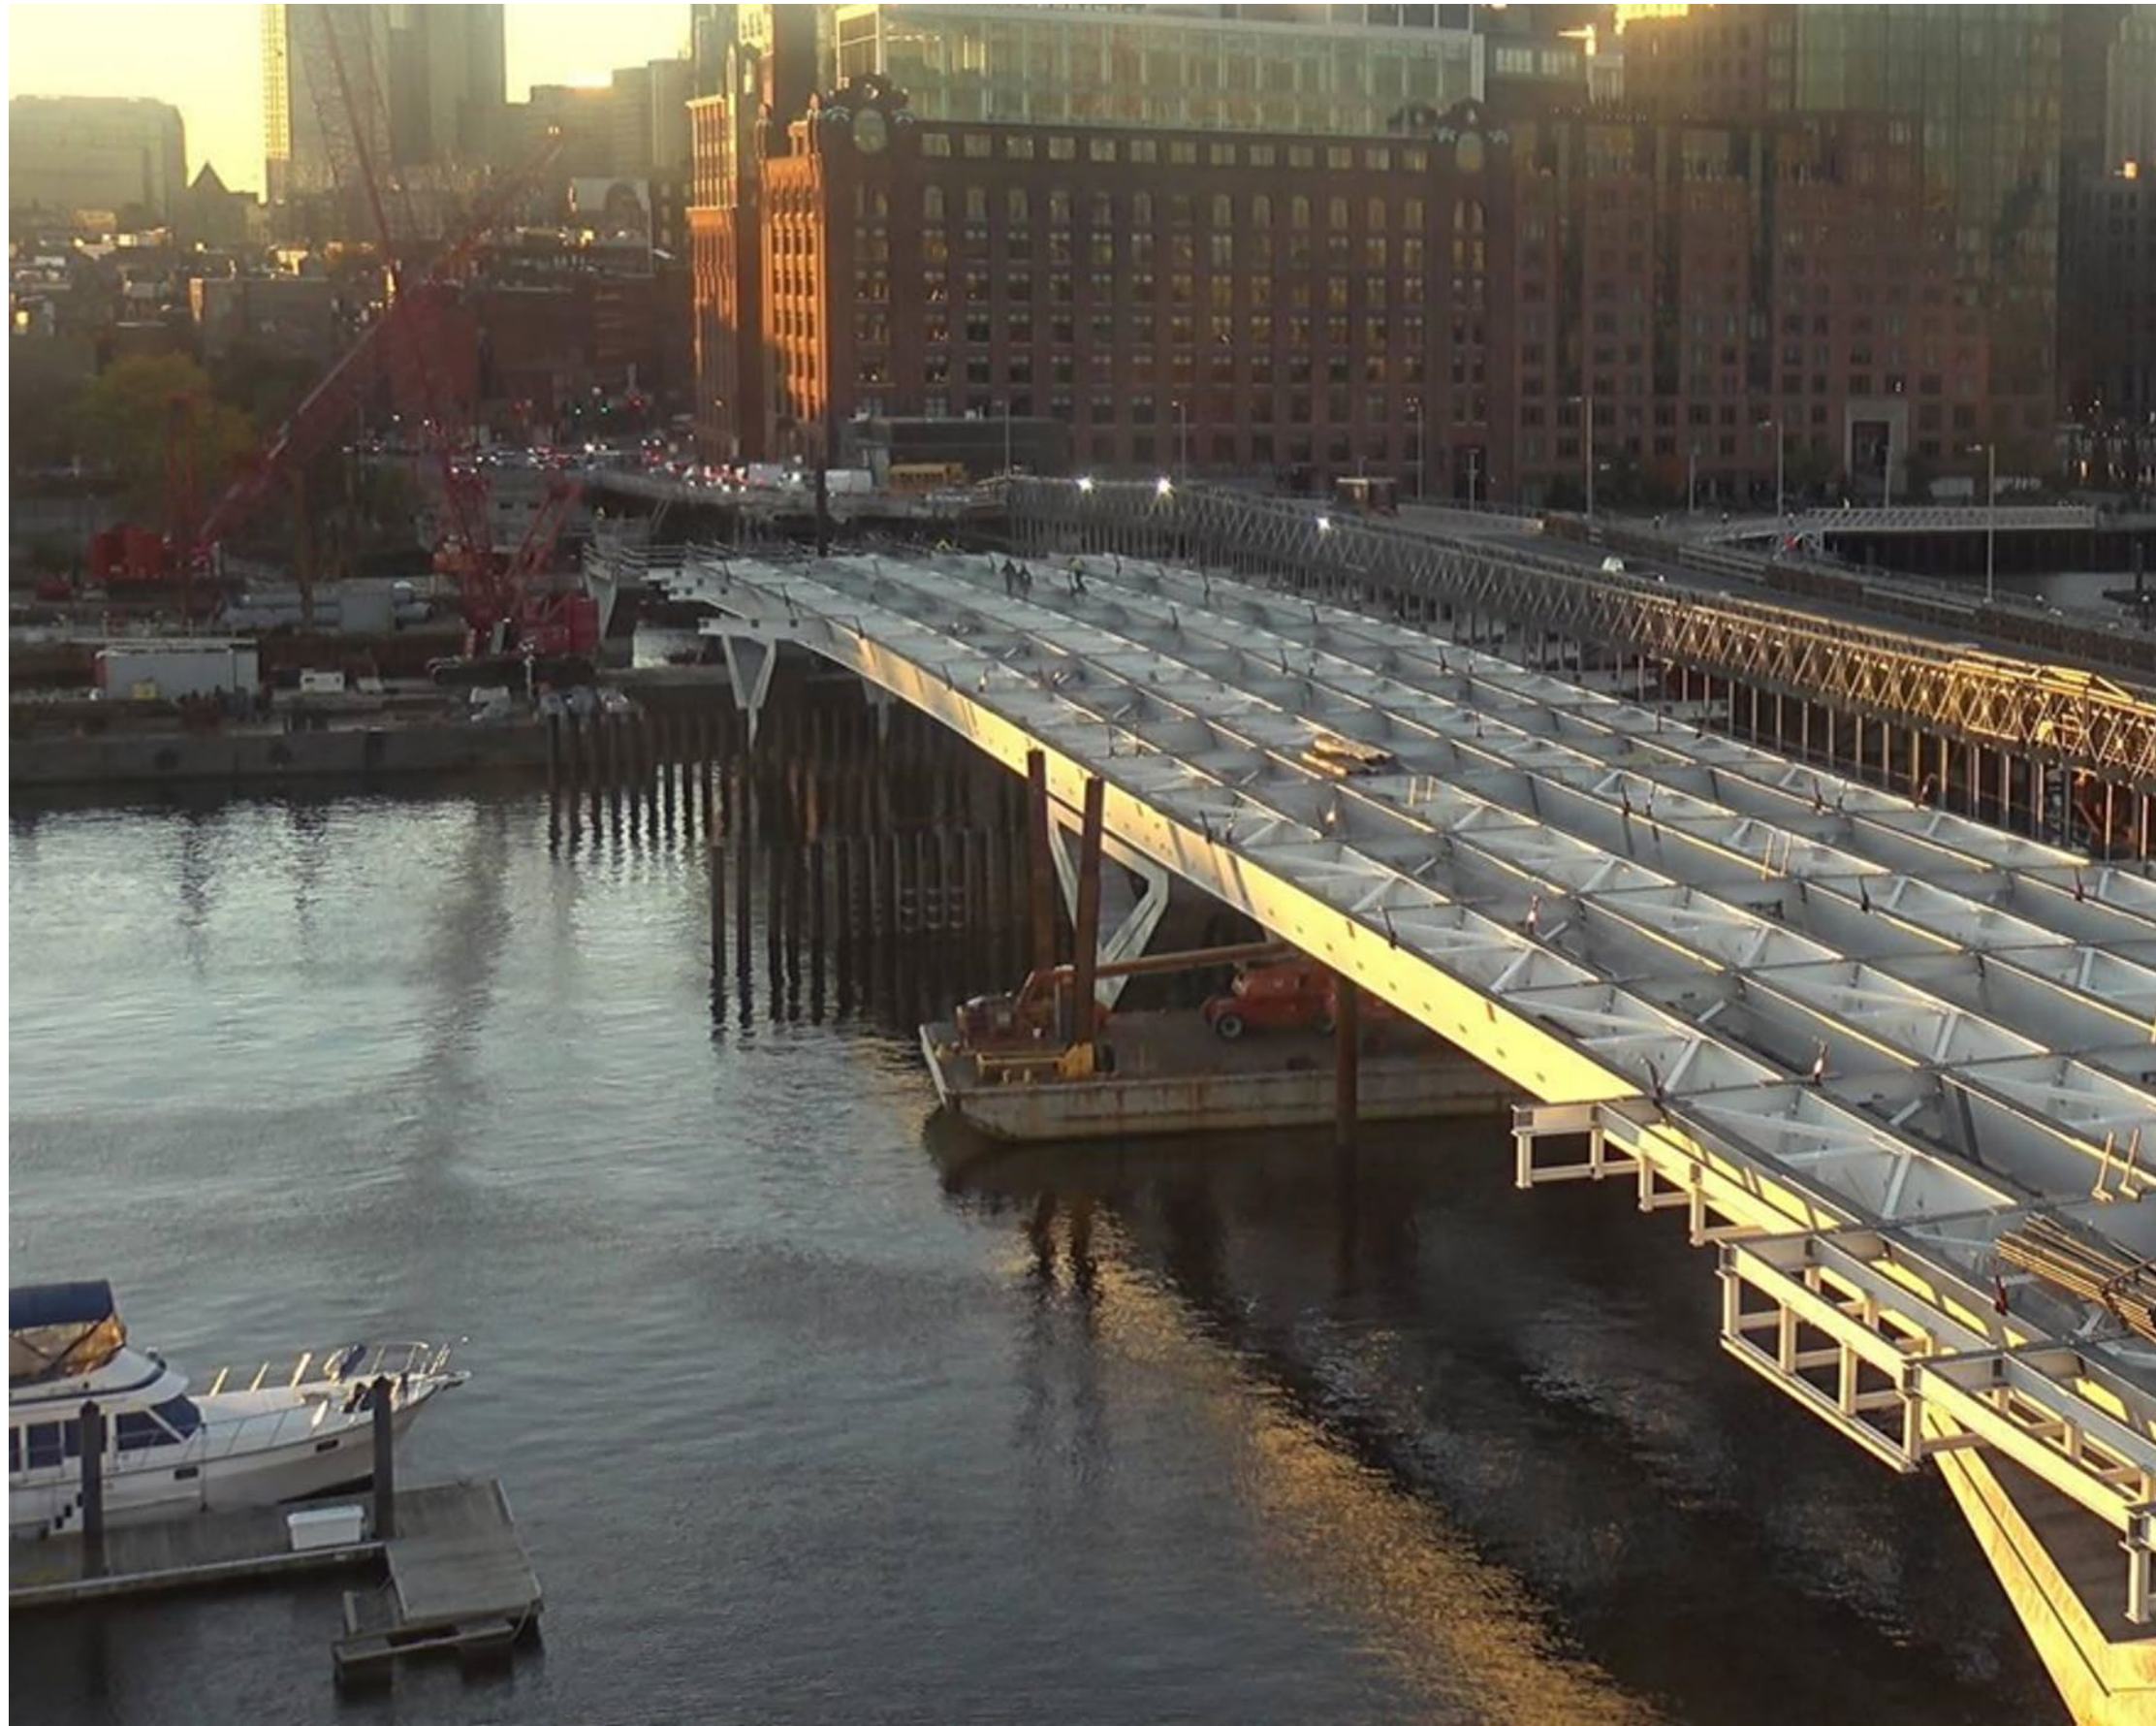



前期工作成绩

- 新桥的桥墩完工
- 新桥的第一部分正在城市广场建造
- 60%的钢材已立起
- 麻州交通部检查员在数个连接点发现52处焊缝破裂，结构施工因此暂停

过去一年里我们做了哪些工作？



什么原因导致暂停？

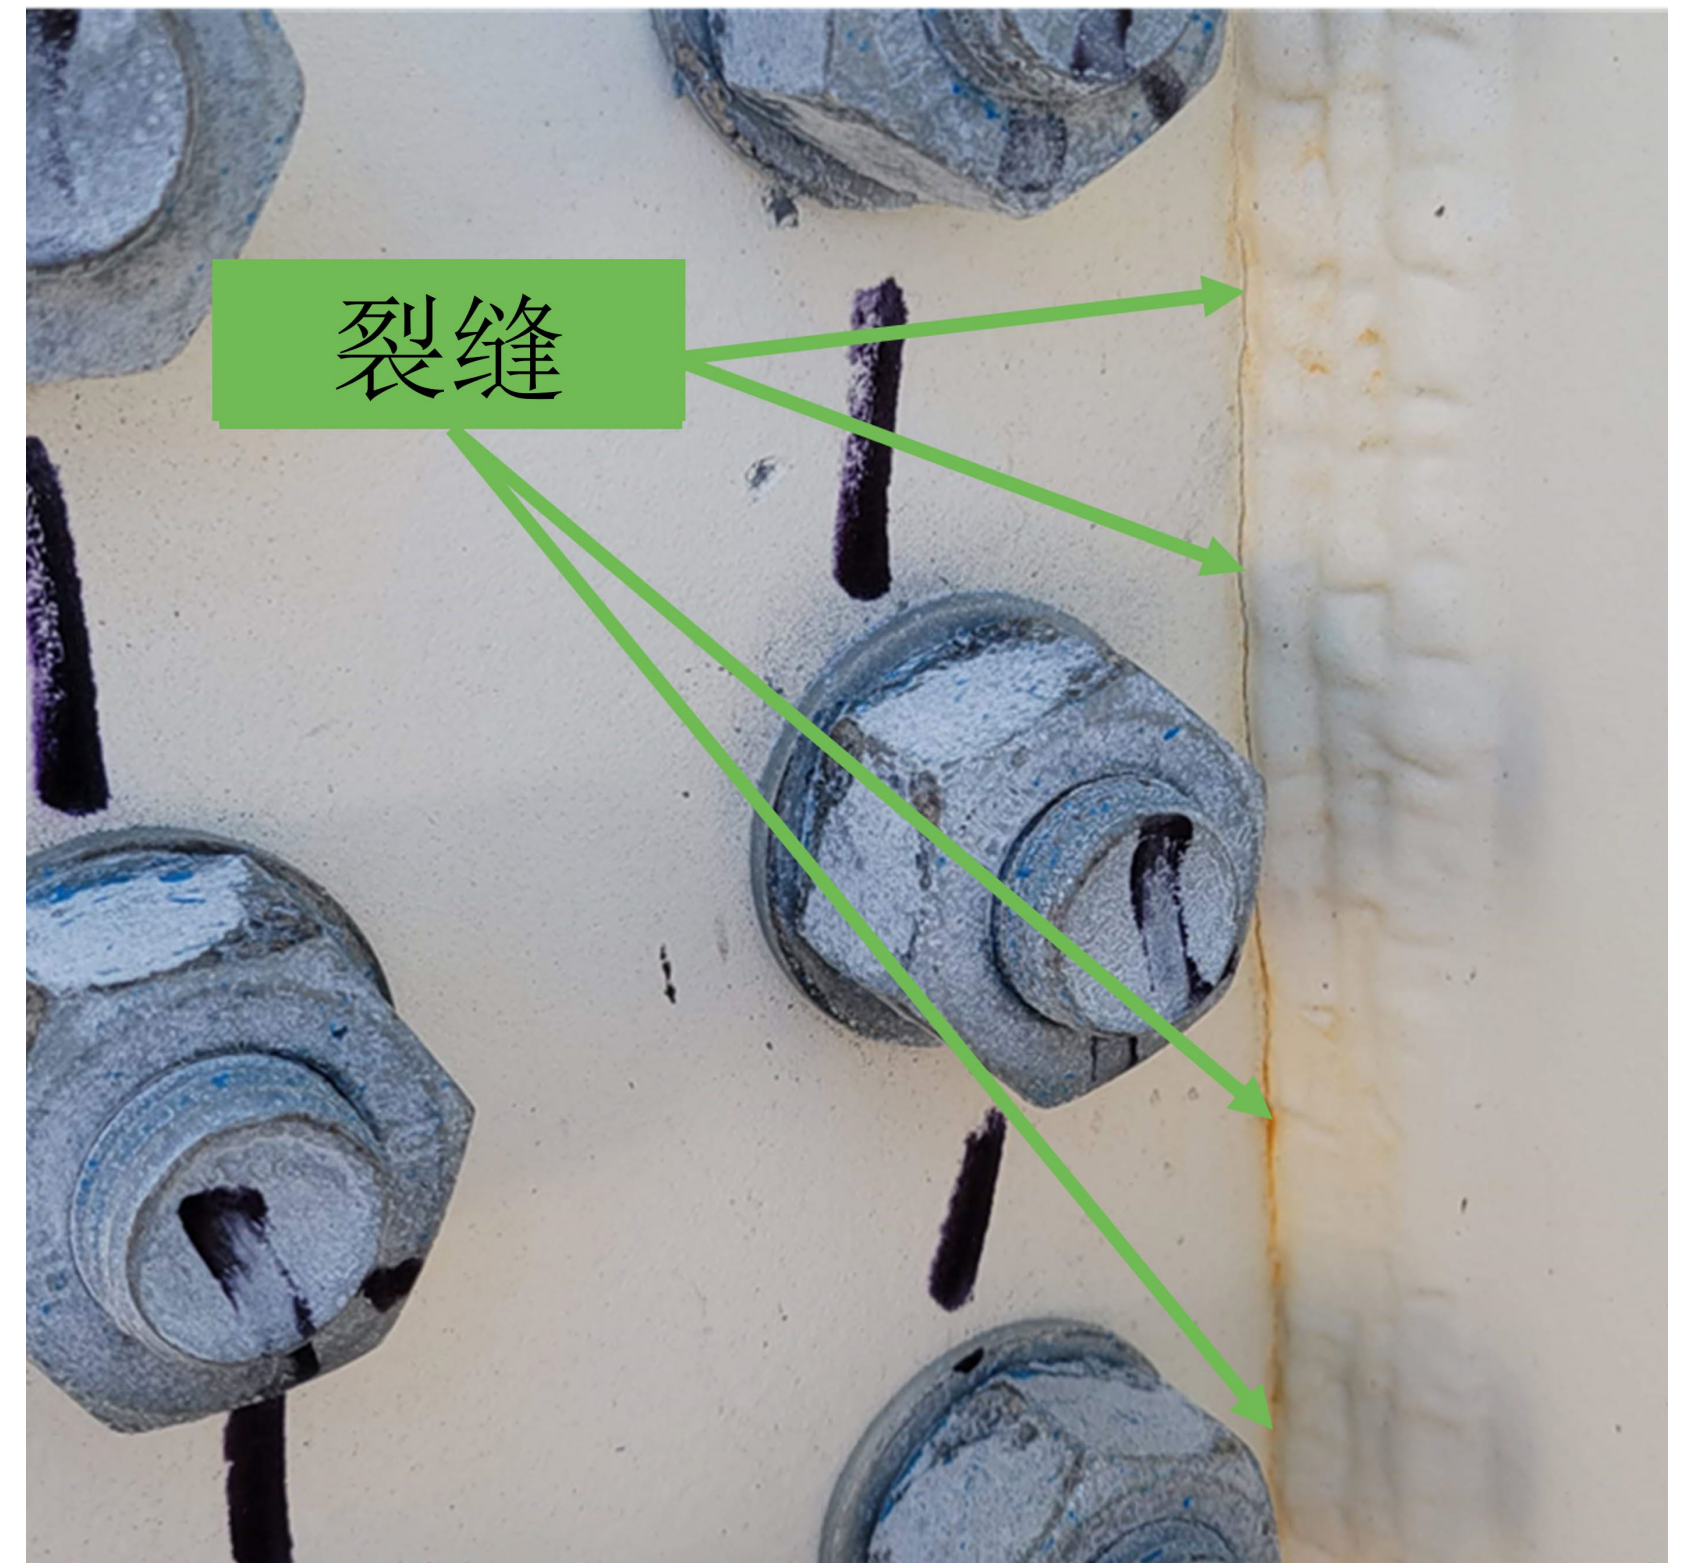
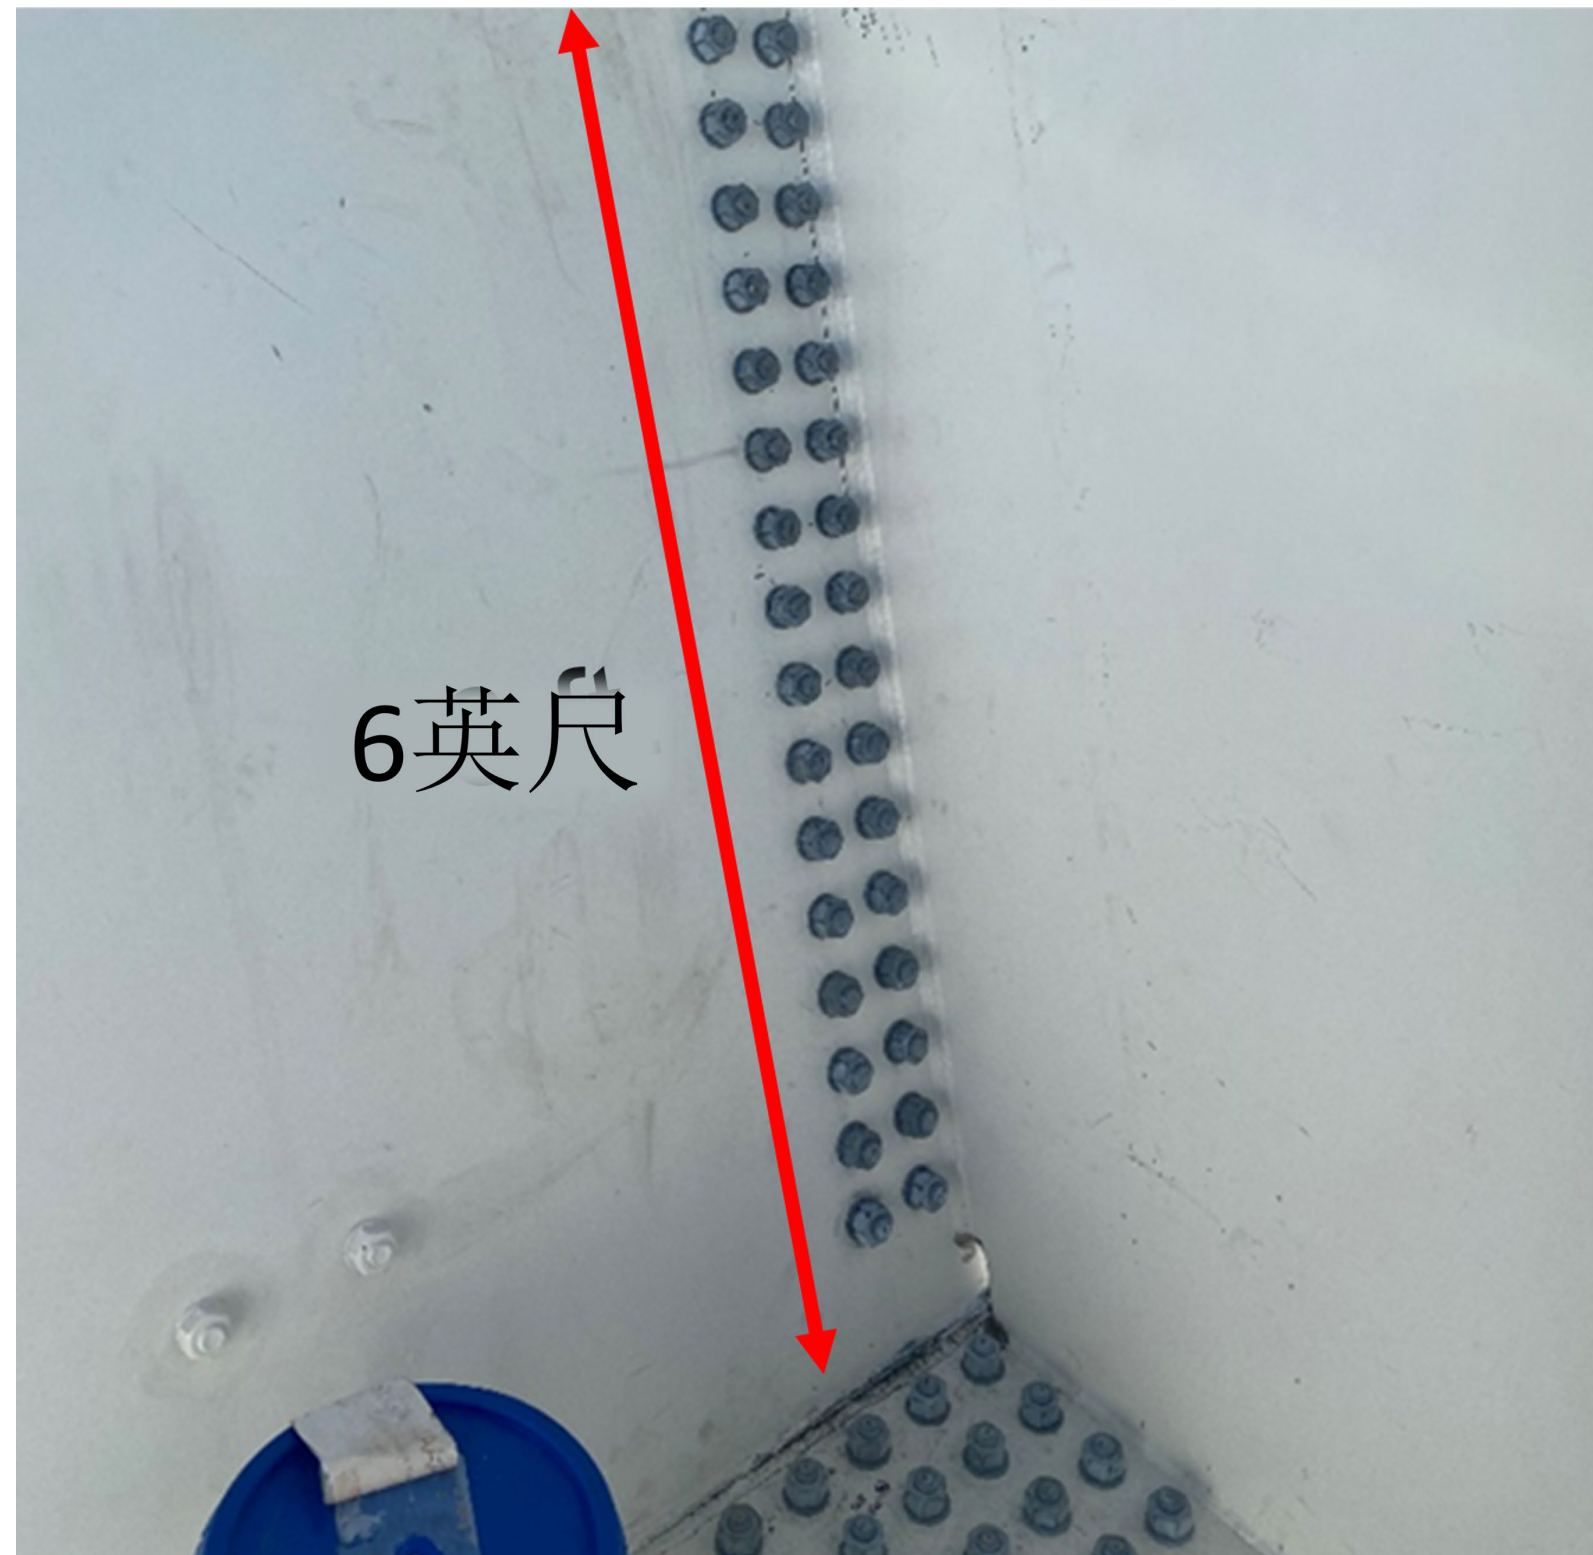


裂缝示例



为什么这些小裂缝如此严重，造成如此长时间的暂停？

- 俗称“脚趾开裂”
- 随着时间的推移，这些小的发丝状裂缝会扩大
- 现场和制造场地均有发现
- 此类裂缝通常在制造后的几天开始出现，并随着时间的推移增长
- 如果不加以解决，钢材的强度能力和结构完整性将大大降低

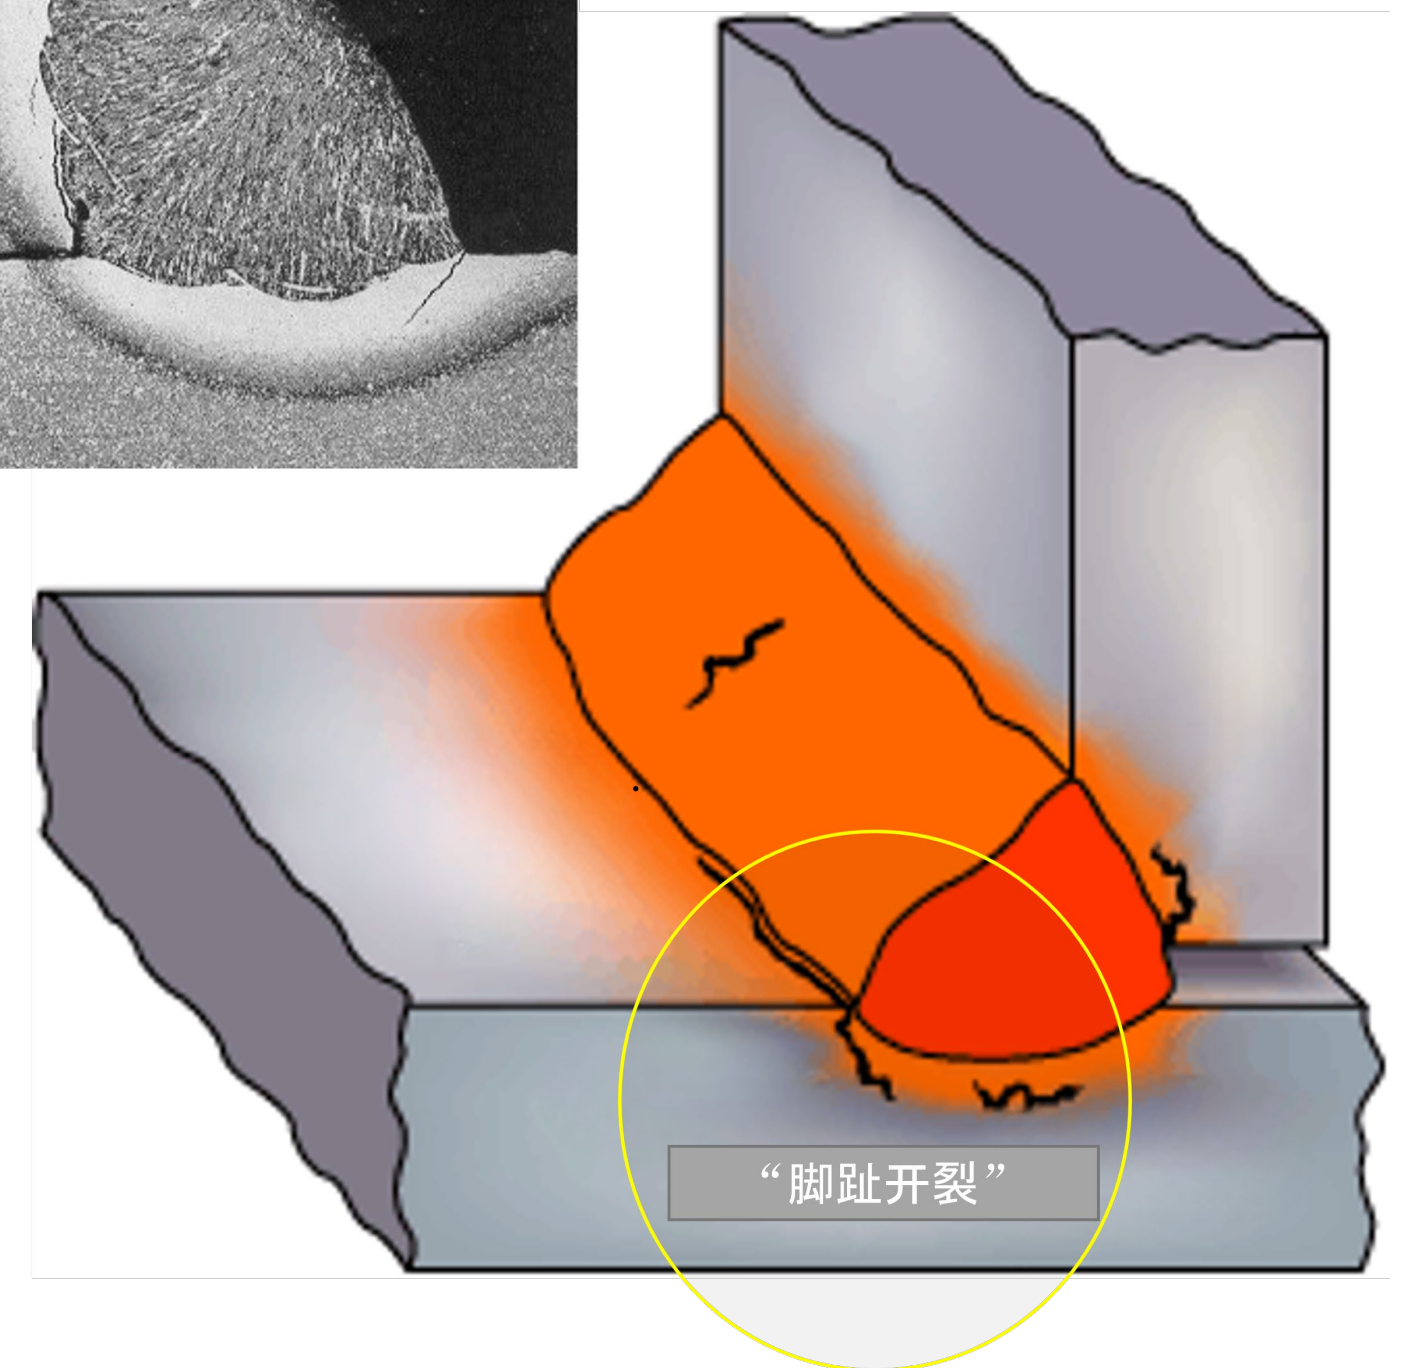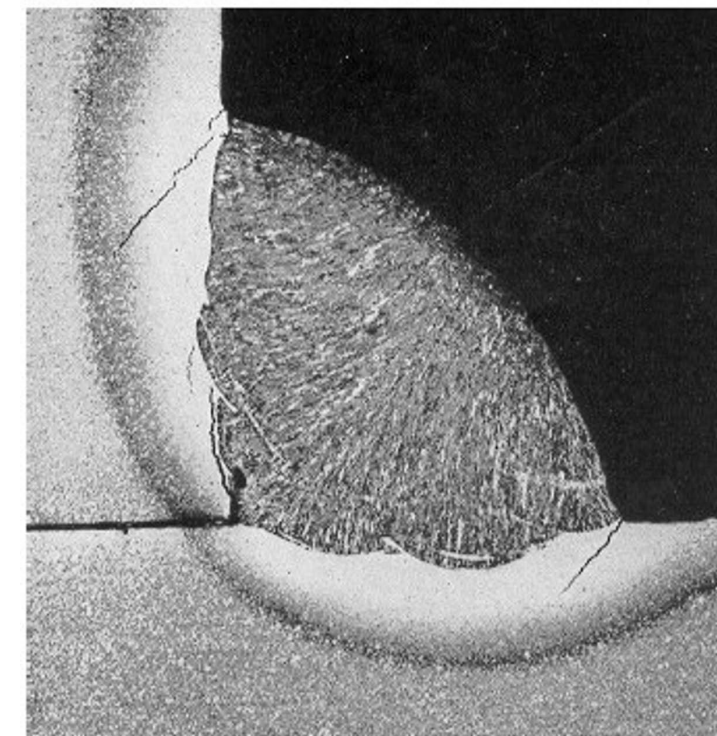

更正措施计划

- 麻州交通部经调查确定并绘制了192个已破裂或有开裂风险的焊缝位置
- 更正措施计划需要对192个点位进行绘制/测试、去除油漆，并根据需要进行修复、热处理以及重新喷漆。
- 对于已发现的52处连接点裂纹，除上述措施外，相应连接点后期将重新焊接。



项目时间表更新

当前预计的项目里程碑


- 交通切换至新桥：2023年12月
- 完全向所有用户开放：2024年12月
- 施工合同完成：3月2025日






交通管理

基尼广场的交通改进和监控

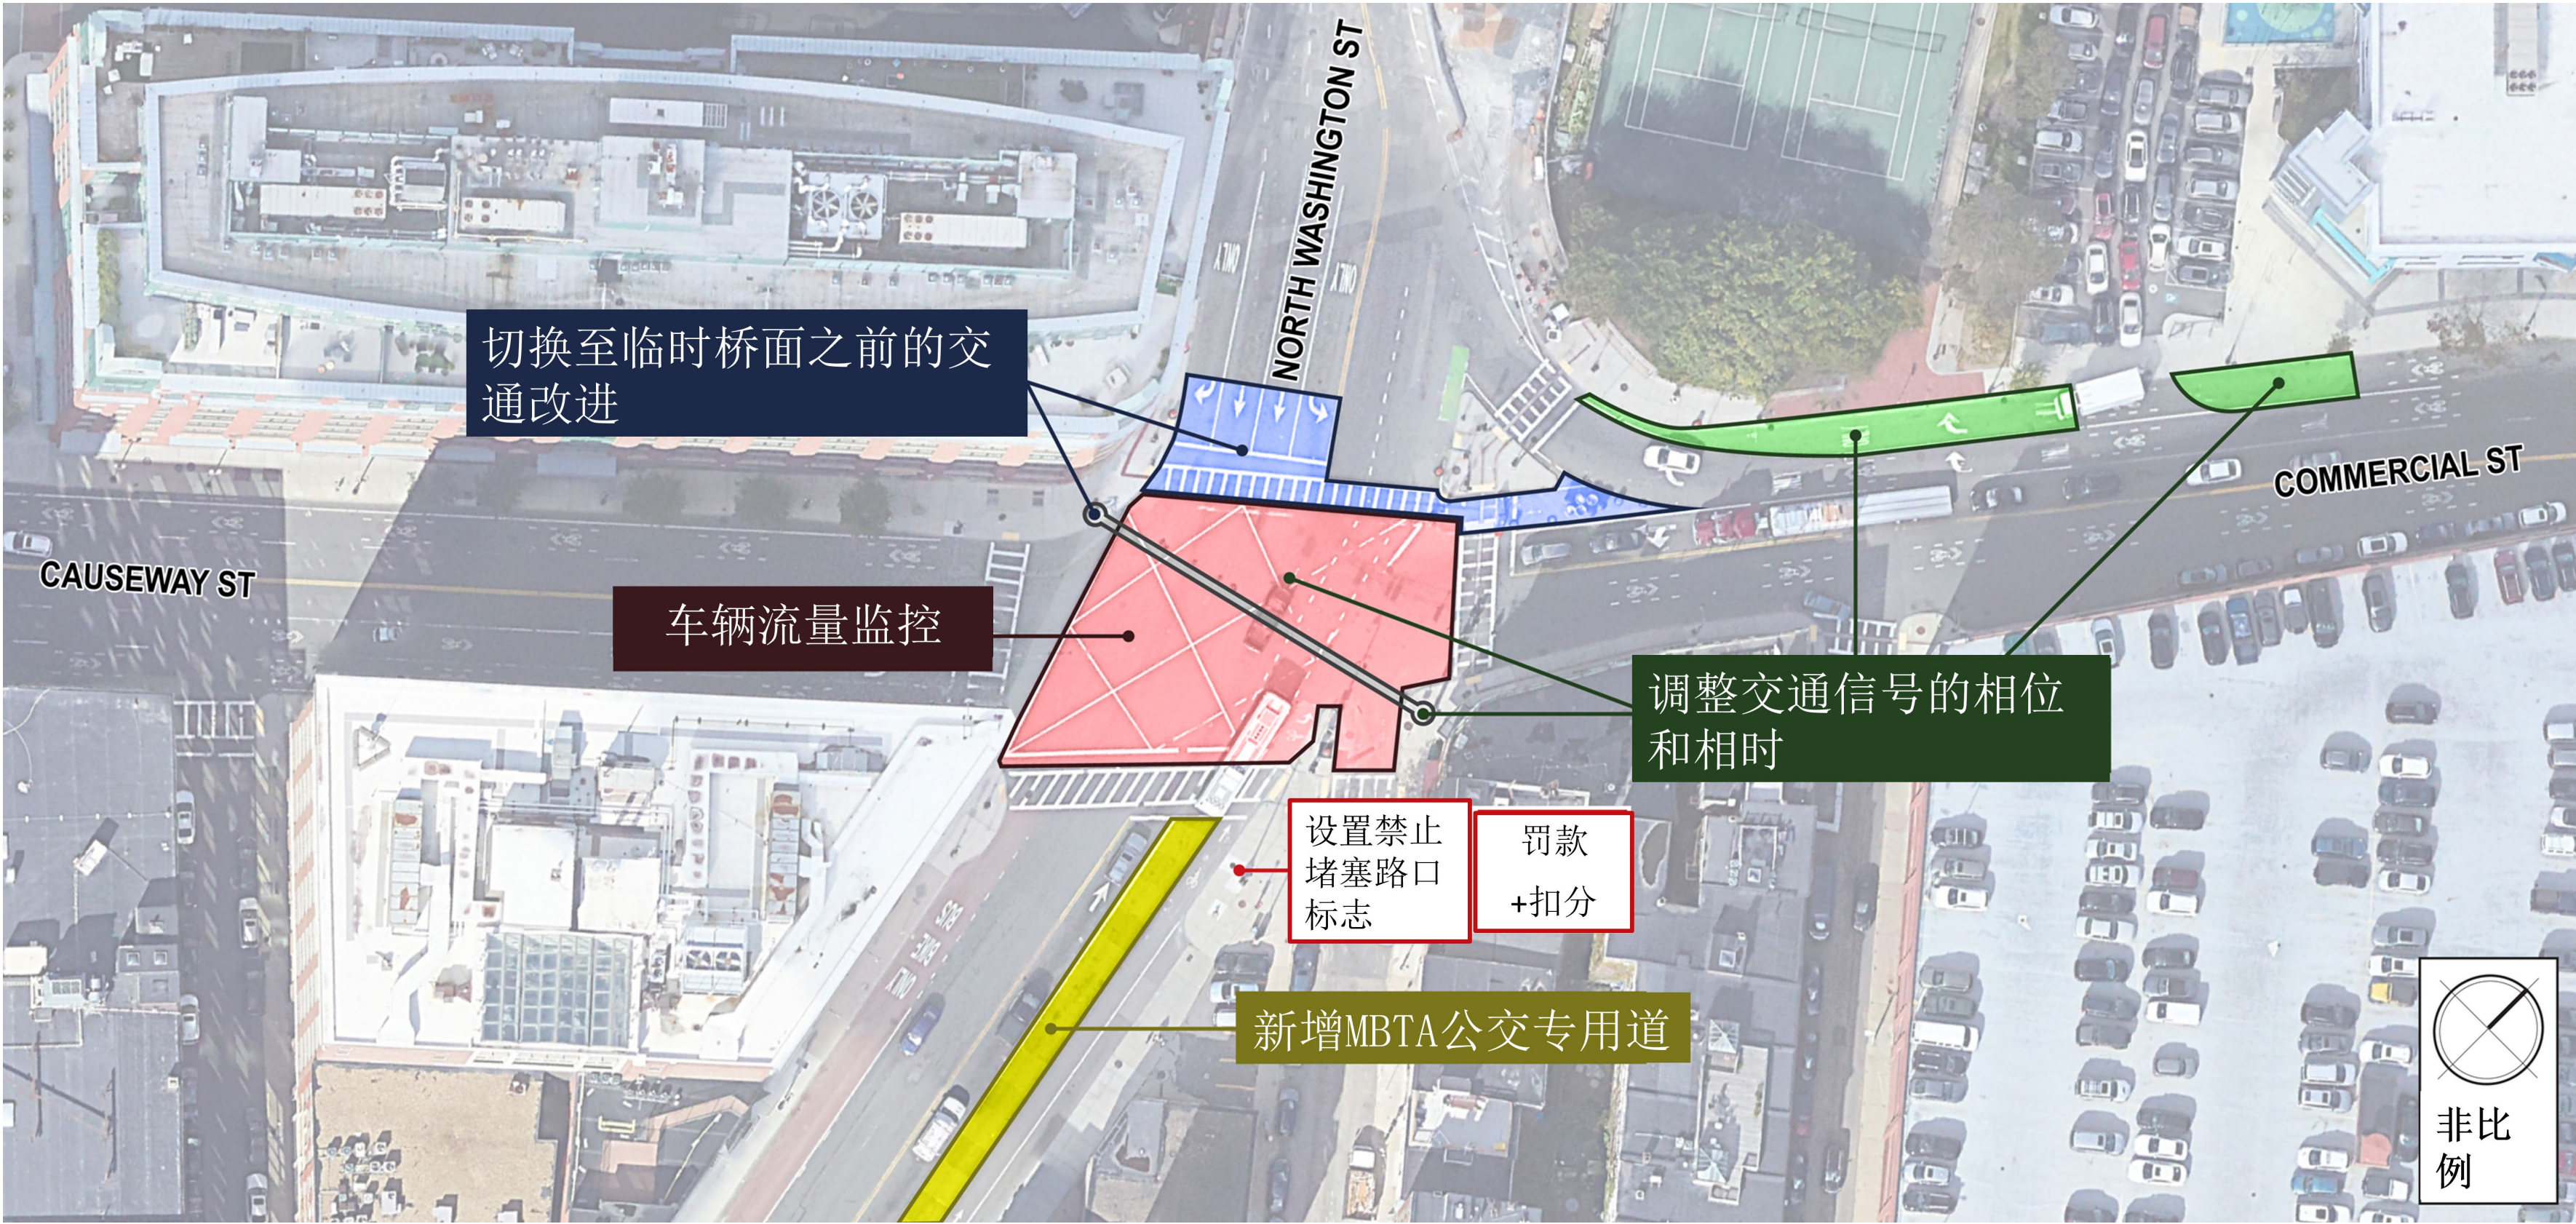

城市广场的交通改进和监控

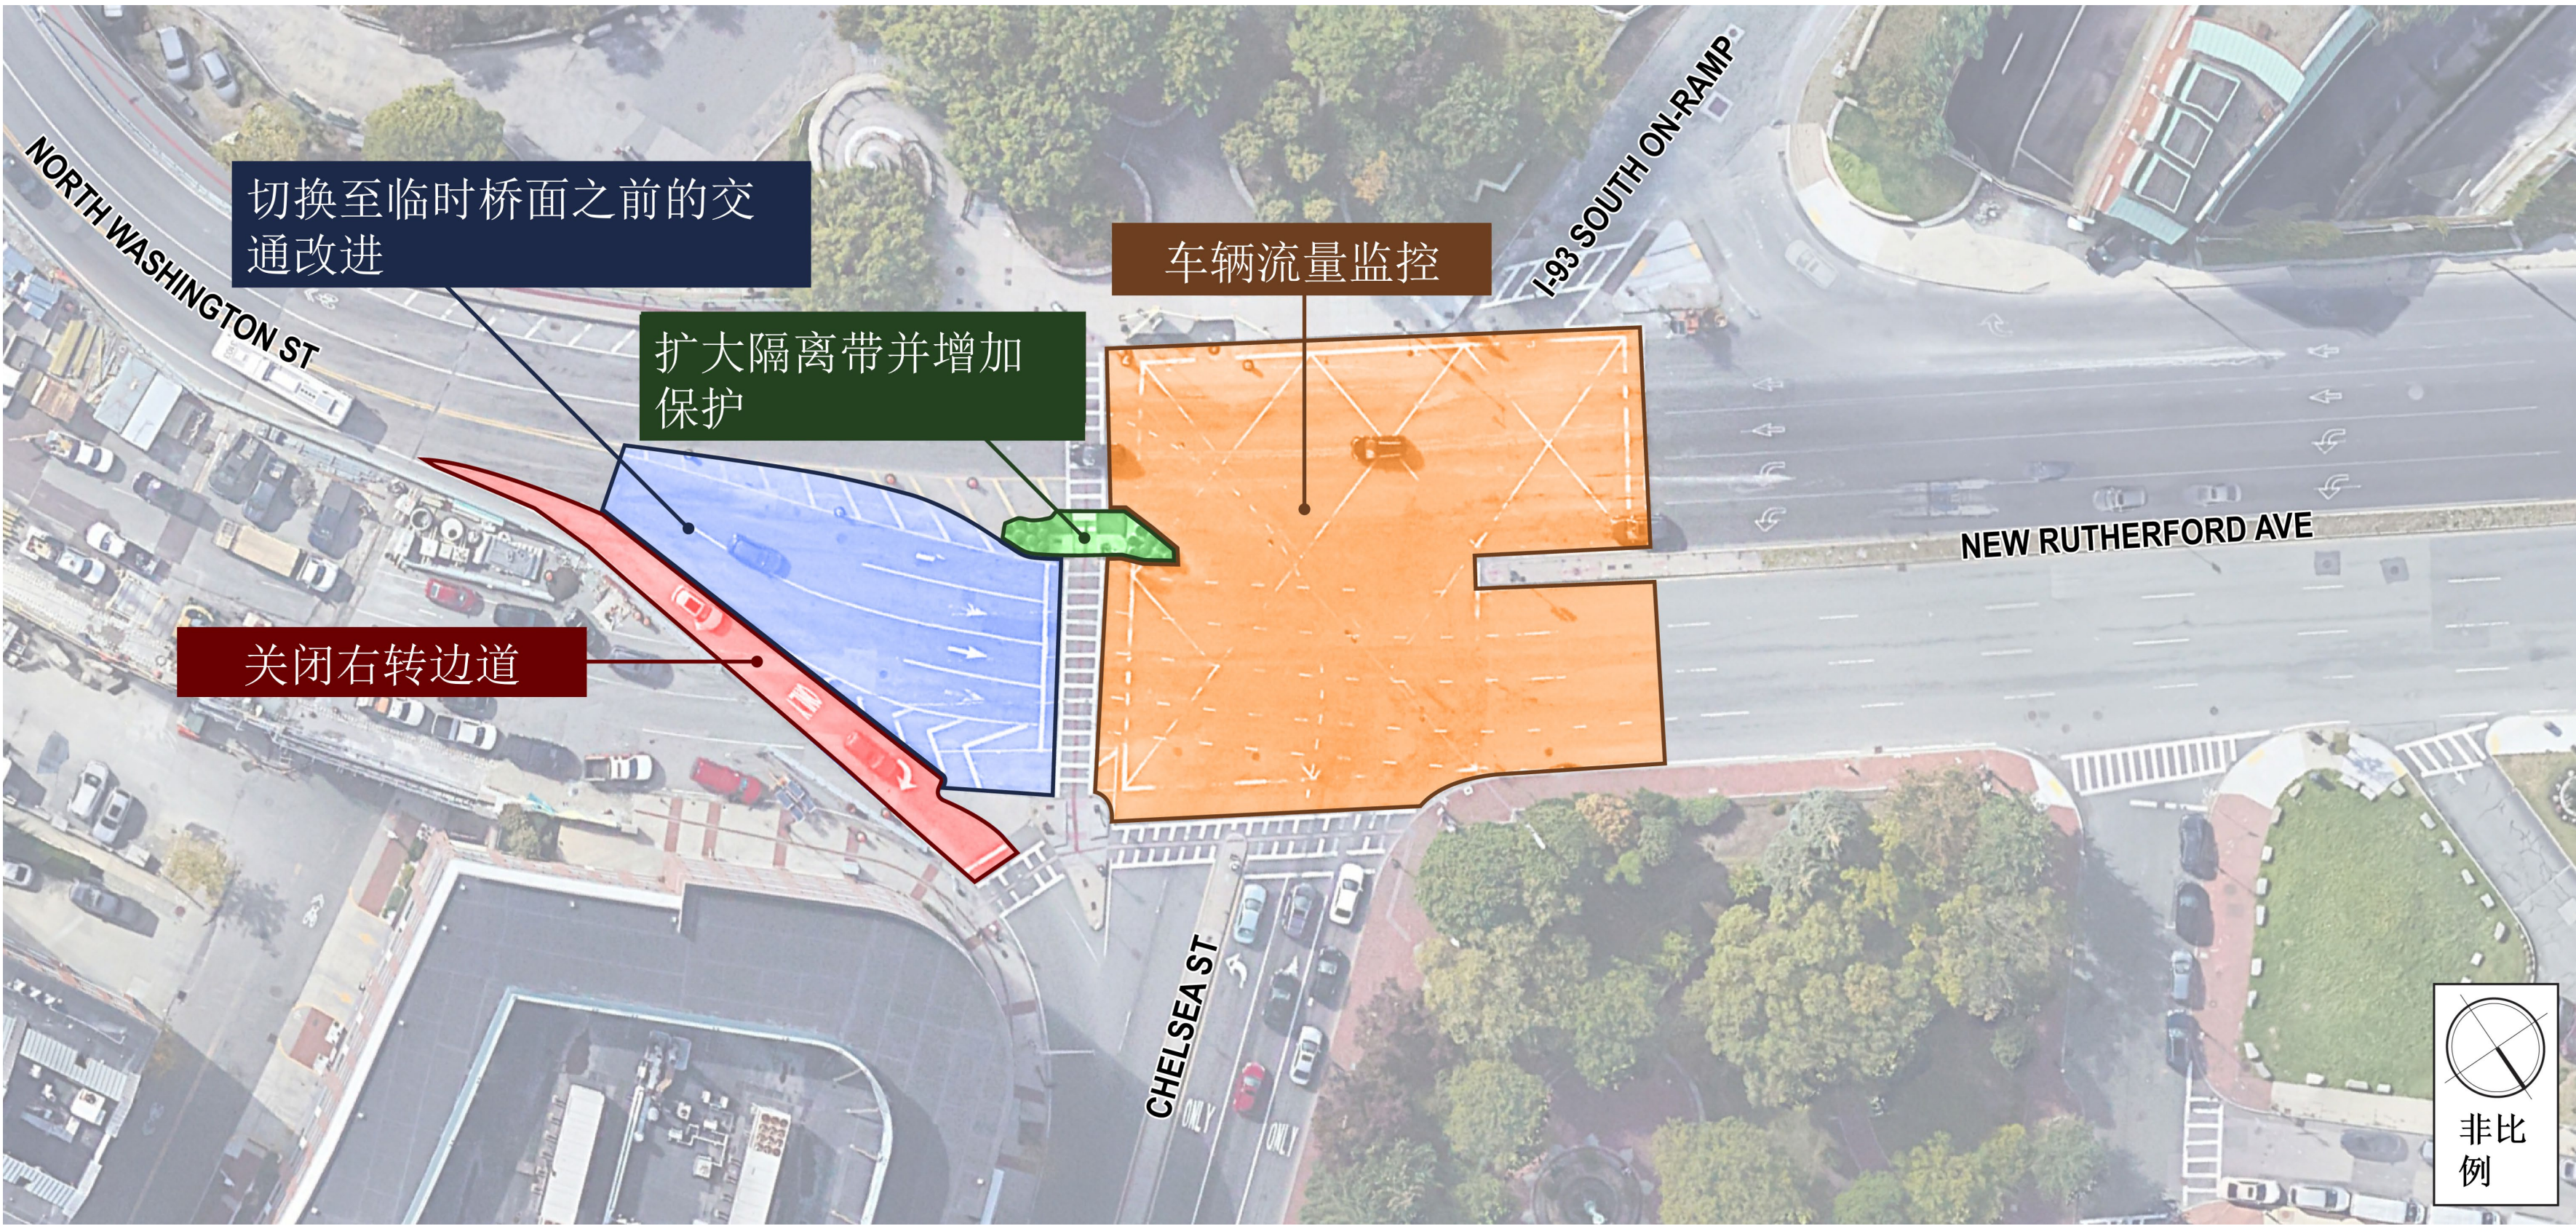

预计项目进度



2022年12月

更正维修措施的预计完成时间



1月2023日

桥面模板施工恢复



3月2023日

钢结构安装施工恢复



2023年4月

混凝土桥面安装和人行道施工开始



2023年12月

- 3条车道的交通转移到新桥
- 临时桥面拆除工作启动



我们将如何让
公众了解情况？

如何联系北华盛顿街项目

如您需要接收项目的更新、参加公众信息会议以及获取有关项目的更多信息，请联系团队：



- 项目邮箱

NorthWashingtonStreet@dot.state.ma.us

- 项目网址

mass.gov/north-washington-street-bridge-replacement



项目网站二维码



问题和讨论

问&答



- “口头提问时请使用“举手”功能取消静音（电话参会则为 Alt + Y）



- 您可以使用“Q&A”按钮提交您的问题和意见



- 请在提问前说明您的姓名



- 一次只发表1个问题或评论，限时2分钟，从而保障他人的参与机会

- 如您通过电话提问，请拨*9，轮到您发言时主持人将播报您电话号码的最后4



位数字，取消您的音频静音



- 请在会议结束后花几分钟时间填写调查，以便我们了解您本次参加在线会议
的体验。

所有问题和意见均需公开披露。以上功能仅限用于与项目相关的业务。

如何连接萨姆纳项目



项目热线

508-510-2920



您可以向项目团队发送电子邮件，提供反馈和问题：

Sumner100@dot.state.ma.us



项目及时更新项目网站：

mass.gov/sumner-tunnel-restoration-project
